


Опросный лист на НКУ ELEMENT

1	Номенклатурное обозначение панели		70E-34.1		
2	Номинальное напряжение, В	<input checked="" type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> Другое	A, B, C		
3	Номинальный ток сборных шин, А	<input checked="" type="checkbox"/> 630 <input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 1250 <input type="checkbox"/> 1600 <input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 2500 <input type="checkbox"/> 3150 <input type="checkbox"/> 4000**	PEN		
4	Материал сборных шин	<input type="checkbox"/> Медь <input checked="" type="checkbox"/> Алюминий			
5	Схема главных цепей				
6	Тип системы заземления	<input checked="" type="checkbox"/> TN-C <input type="checkbox"/> TN-C-S <input type="checkbox"/> TN-S <input type="checkbox"/> Другое	PEN		
7	Номер панели				
8	Тип панели				
9	Блок	Тип	Вводная		
10	функциональный	Номер схемы вторичных цепей			
11	Разъединитель	Тип	PE19-39		
12	Выключатель автоматический	Тип выключателя	BA51-39	BA47-100	BA47-29
13		Тип расцепителя			
14		Номинальный ток выключателя In, А	630	80	16
15		Уставка теплового расцепителя, x In			
16		Уставка эл. магнитного расцепителя, А			
17		Дополнительные аксессуары	344730		
18	Предохранитель	Тип			
19		Номинальный ток предохранителя, А			
20		Номинальный ток плавкой вставки, А			
21	Трансформаторы тока	Измерение	Козф. трансф. (кл. точн. 0,5)	600/5	
22		Учет	Козф. трансформации	600/5	
23			Класс точности обмотки	0,5S	
24	Защита	Козф. трансформации			
25	Приборы контроля и индикации	Амперметр, шт.	3		
26		Вольтметр 0...500В, шт.	1		
27	Счетчик электроэнергии	Тип	Меркурий 234 ARTM-03 PBR.G	да	
28		Место установки	дверь		
29		Комплектная поставка	да		
30	Другое оборудование				
31	Количество, число жил и сечение подводимых кабелей***				
32	Назначение фидера		Ввод	ЩСН	ППУ
33	Количество торцевых панелей (только для ЩО70 и 70E), шт.				
34	Высота панелей без плинтас (только для ЩО70 и 70E), мм		<input checked="" type="checkbox"/> 1800 <input type="checkbox"/> 2000		
35	Комплект ОПН во вводных панелях		<input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Да		
36	Автоматический ввод резерва		<input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> ПР110* <input type="checkbox"/> Zelio Logic		
37	Защита от замыкания на землю на вводе		<input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да		
38	Защита от перегрева обмоток силового трансформатора		<input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да		
39	Механическая блокировка с ЧВН на замках Гинодмана		<input checked="" type="checkbox"/> Нет* <input type="checkbox"/> Да		
40	Телемеханика		<input checked="" type="checkbox"/> Нет* <input type="checkbox"/> Да		
41	Способ поставки панелей		<input checked="" type="checkbox"/> Стандарт* <input type="checkbox"/> В БМЗ <input type="checkbox"/> Другое		
42	Упаковка		<input checked="" type="checkbox"/> Стандарт* <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Другое		

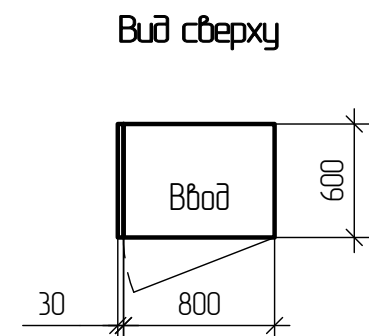

*** - при отсутствии информации от Заказчика максимальное количество и сечение подключаемого к отходящим линиям кабеля регламентируются следующей таблицей:

Номинальный ток автоматического выключателя, А	Максимальное количество и сечение кабеля, подключаемого на фазу	Рекомендуемый тип применяемых для подключения окончечников
100...250	2(1x95)	ТМЛ 95-10-15
400...630	2(1x150)	ТМЛ 150-12-19
800...1600	4(1x240)	ТМЛ 240-16-24

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						<i>MM-70E-34.1-ЭМ3.01</i>		
						<i>НКУ "ELEMENT" серии 70E</i>		
<i>Изм.</i>	<i>Кол.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>			
<i>Разраб</i>	<i>Клыкова</i>				16.12.20			
<i>Проверил</i>	<i>Цапенко</i>				16.12.20			
						<i>29-Вводная панель 630А (Сх.34.1)</i>		
						<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
								1
						<i>Опросный лист</i>		
						<i>Мастер модель</i>		
<i>Утвердил</i>	<i>Деоченко</i>				16.12.20			

* - параметры стандартной конфигурации;
** - номинальный ток сборных шин 4000А только для НКУ ELEMENT серии NDE и только с медными шинами.
