


Опросный лист на НКУ ELEMENT

1	Номенклатурное обозначение панели		70E-98.3		
2	Номинальное напряжение, В	<input checked="" type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> Другое	A,B,C		
3	Номинальный ток сборных шин, А	<input type="checkbox"/> 630 <input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 1250 <input checked="" type="checkbox"/> 1600 <input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 2500 <input type="checkbox"/> 3150 <input type="checkbox"/> 4000**			
4	Материал сборных шин	<input type="checkbox"/> Медь <input checked="" type="checkbox"/> Алюминий			
5	Схема главных цепей				
6	Тип системы заземления	<input checked="" type="checkbox"/> TN-C <input type="checkbox"/> TN-C-S <input type="checkbox"/> TN-S <input type="checkbox"/> Другое	PEN		
7	Номер панели				
8	Тип панели		Вводная		
9	Блок	Тип			
10	функциональный	Номер схемы вторичных цепей			
11	Разъединитель	Тип			
12	Выключатель автоматический	Тип выключателя	AN16D3	BA47-100	BA47-29
13		Тип расцепителя	Тип А		
14		Номинальный ток выключателя In, А	1600	80	16
15		Уставка теплового расцепителя, x In	0,4...1		
16		Уставка эл. магнитного расцепителя, А			
17	Дополнительные аксессуары				
18	Предохранитель	Тип			
19		Номинальный ток предохранителя, А			
20		Номинальный ток плавкой вставки, А			
21	Трансформаторы тока	Измерение	Козф. трансф. (кл. точн. 0,5)	1500/5	
22		Учет	Козф. трансформации	1500/5	
23		Защита	Класс точности обмотки	0,5S	
24			Козф. трансформации		
25	Приборы контроля и индикации	Амперметр, шт.	3		
26		Вольтметр 0...500В, шт.	1		
27	Счетчик электроэнергии	Тип	Меркурий 234 ARTM-03 PBR.G		
28		Место установки	дверь		
29		Комплектная поставка	да		
30	Другое оборудование				
31	Количество, число жил и сечение подводимых кабелей***				
32	Назначение фидера		Ввод	ЩСН	ППУ
33	Количество торцевых панелей (только для ЩО70 и 70E), шт.		1		
34	Высота панелей без плинтас (только для ЩО70 и 70E), мм		<input checked="" type="checkbox"/> 1800	<input type="checkbox"/> 2000	
35	Комплект ОПН во вводных панелях		<input type="checkbox"/> Нет	<input checked="" type="checkbox"/> Да	
36	Автоматический ввод резерва		<input type="checkbox"/> Нет	<input checked="" type="checkbox"/> ПР110*	<input type="checkbox"/> Zelio Logic
37	Защита от замыкания на землю на вводе		<input checked="" type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да	
38	Защита от перегрева обмоток силового трансформатора		<input checked="" type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да	
39	Механическая блокировка с ЧВН на замках Гинодмана		<input checked="" type="checkbox"/> Нет*	<input type="checkbox"/> Да	
40	Телемеханика		<input checked="" type="checkbox"/> Нет*	<input type="checkbox"/> Да	
41	Способ поставки панелей		<input checked="" type="checkbox"/> Стандарт*	<input type="checkbox"/> В БМЗ	<input type="checkbox"/> Другое
42	Упаковка		<input checked="" type="checkbox"/> Стандарт*	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Другое

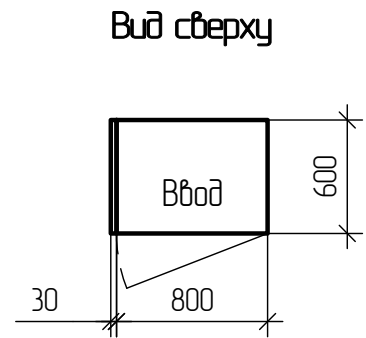

*** - при отсутствии информации от Заказчика максимальное количество и сечение подключаемого к отходящим линиям кабеля регламентируются следующей таблицей:

Номинальный ток автоматического выключателя, А	Максимальное количество и сечение кабеля, подключаемого на фазу	Рекомендуемый тип применяемых для подключения наконечников
100...250	2(1x95)	ТМ/1 95-10-15
400...630	2(1x150)	ТМ/1 150-12-19
800...1600	4(1x240)	ТМ/1 240-16-24

Согласовано

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

MM-70E-98.3-ЭМ3.0/1					
НКУ "ELEMENT" серии 70E					
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб	Клыкова				09.10.20
Проверил	Цапенко				09.10.20
29-Вводная панель 1600А (Сх.98.3)					Страница
					Лист
					Листов
Опросный лист Мастер модель					1
Утвердил Деоченко					09.10.20



* - параметры стандартной конфигурации;
** - номинальный ток сборных шин 4000А только для НКУ ELEMENT серии NDE и только с медными шинами.
